



Rijkswaterstaat

Bewonersgroepenoverleg

Planstudie Knooppunt
Hoevelaken

11 mei 2011




Agenda 11 mei 2011

1. Terugblik
2. Ontwikkelingen, huidige stand van zaken
3. Marktbenadering
4. Vervolgproces



1. Knooppunt Hoevelaken

- Planstudie: 2008-2013
- Realisatie: 2016-2020
- Programma VERDER
- Raakvlak: A28 spoedaanpak

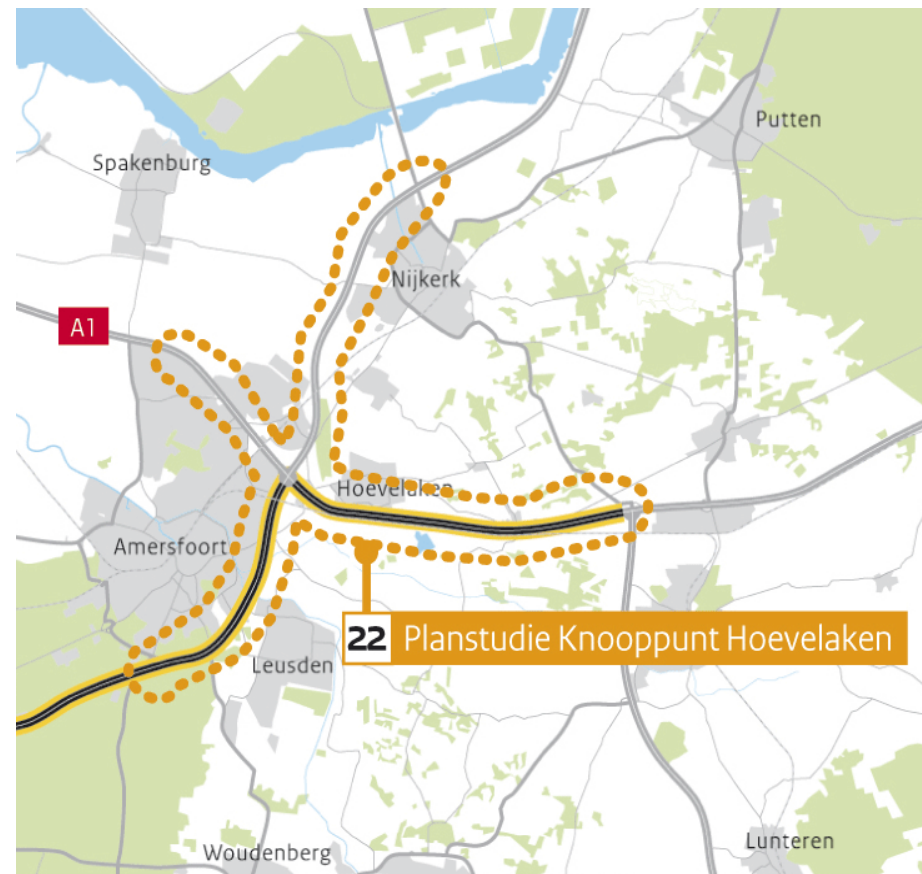



2. Ontwikkelingen na oktober 2010

- Referentieontwerp verder uitgewerkt
- Kosten voor referentieontwerp geraamd op € 1100 mln. Te hoog t.o.v. beschikbaar budget (€ 800 mln)
- Versobering noodzakelijk!
- Besloten tot vroegtijdige marktbenadering



3. Marktbenadering

- Markt eerder bij project betrekken
- Vraag aan markt:
 - Binnen budget realiseren van minimumpakket (Programma van Eisen) en zoveel mogelijk wensen (Programma van Wensen)
 - Uitvoeringstermijn: voor 2020 gereed!



Gevolgen

- Eerst aanbiedingen van marktpartijen, daarna verdere planprocedure (Ontwerp) Tracé Besluit / Milieu Effect Rapportage
- Later dan oorspronkelijk gepland voorkeursvariant en start (Ontwerp) Tracé Besluit / Milieu Effect Rapportage
- Komende periode proces vormgeven om tot marktbenadering te komen



4. Vervolgproces


- Traject met regionale overheden gestart om te kijken naar versoberings- en inpassingsmogelijkheden
- Varianten/ideeën van andere belanghebbenden zoals SHB&L zijn nader uitgewerkt en globaal vergeleken met het referentieontwerp voor de aspecten lucht, geluid en kosten
- Komende tijd met omgeving Programma van Eisen en Programma van Wensen bepalen. Onderdeel hiervan is, bepalen hoe het referentieontwerp en de aanvullende varianten en ideeën meegenomen worden bij de marktbenadering



Vraagstuk

- Hoe zou u betrokken willen worden bij vervolgproces?

Nieuw proces project knooppunt Hoevelaken

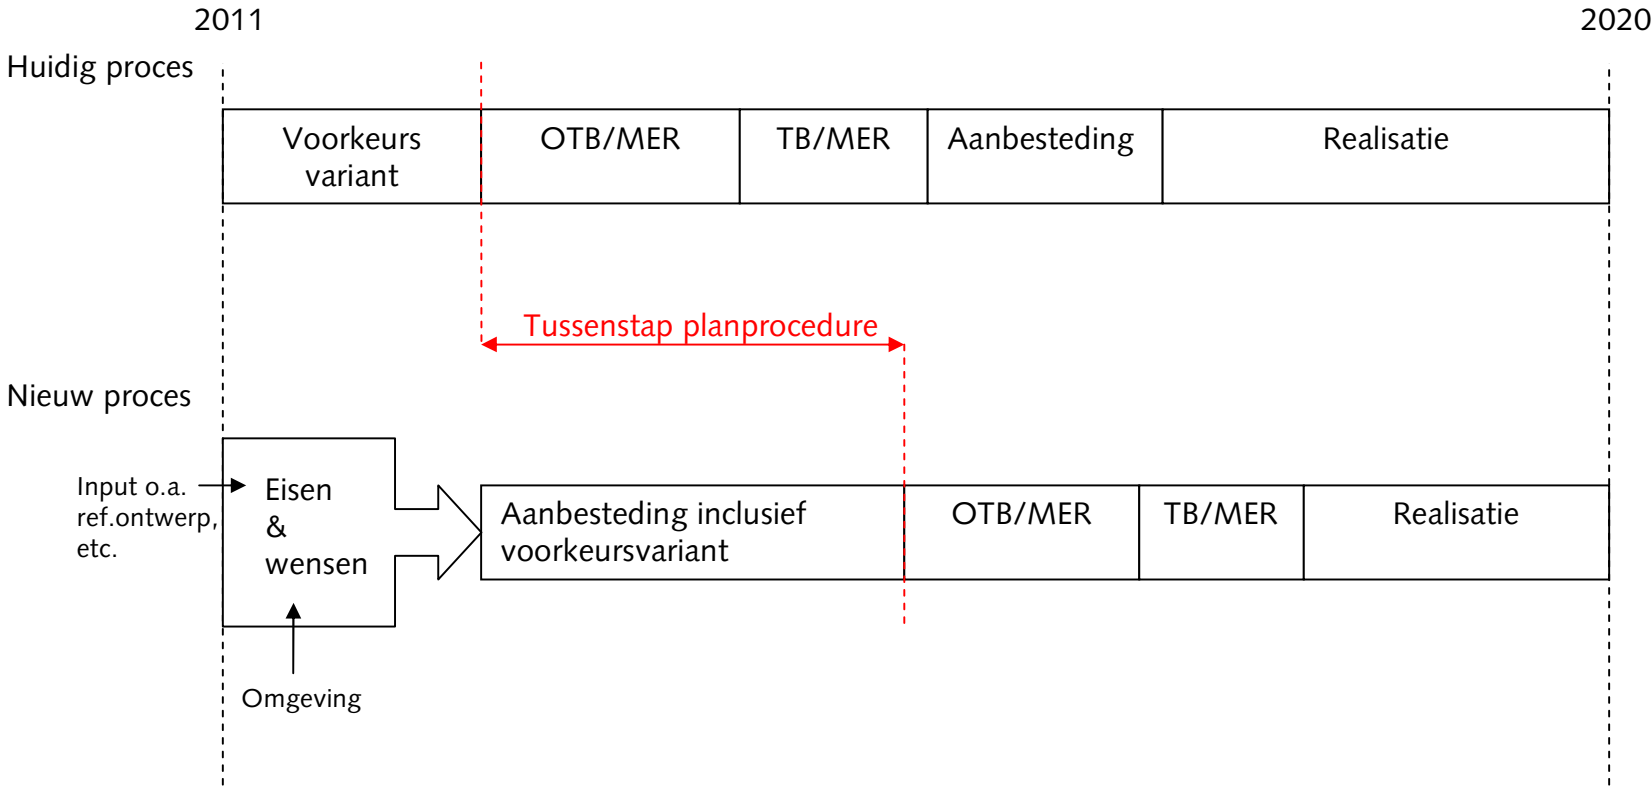

Opmerkingen flap mbt betrokkenheid bij vroegtijdige marktbenadering

- Echte betrokkenheid niet vrijblijvend. Participatie op basis van coöperatie.
- Rol definiëren met bevoegdheden en mandaten
- Heldere afspraak maken over procentuele verdeling tussen leefbaarheid en techniek
- Geef meer openheid in de gegevens die achter het ontwerp liggen
- Betrokkenheid bij keuze/beoordeling aanbiedingen marktpartij
- Communiceer elke stap die RWS zet

Volgende bijeenkomst na de zomer
